


Contraloría Municipal



Ing. Jose Juan Tapia Lopez Auditor de Obra Publica

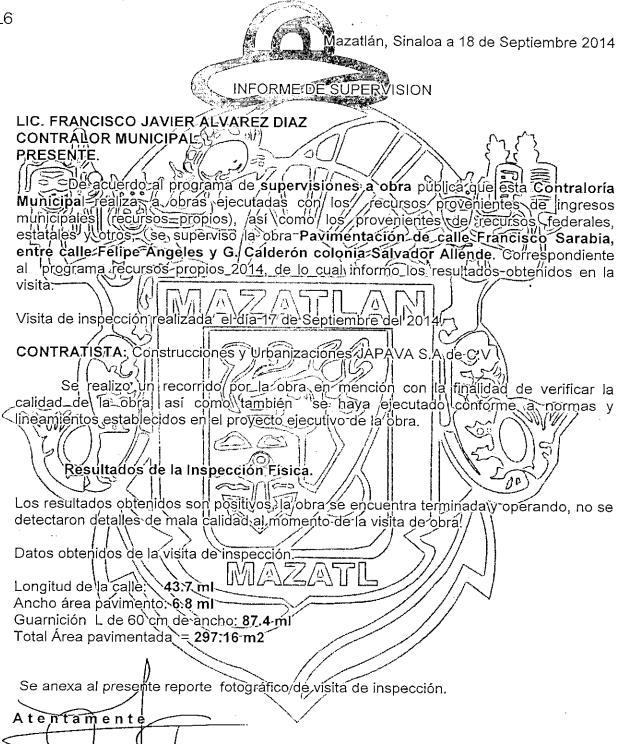

Mar to Ora



Contraloría Municipal

Fecha: 18/Septiembre/2014

At the Comment of the	(SIONDEOBRAIRUEMGA OBRA	
	DATOS GENERALES DE LA OBRA	
Oficio de Aprobaci Oficio Ampliacion:	ón: 55/2014	
Fondos:	Obra Publica Directa	
Importe Aprobado	\$246,209.50	
Importe Ejercido	(En proceso 89%)	
Contratista	Construcciones y Urbanizaciones Japava.	
	Contraloría.	
	Contraloría:	
	Ing. Jose Juan Tapia Lopez	
Frentes en los que se esta trabajando		
Albañilería Tablaroca Platones Acabados Pintura	Herreria Ins. Sanitaria Carpinteria Inst. Hidráulica Canceleria Inst. Eléctrica Obras EXT. Inst. Gas Pavimentación inst. Equipo	
REPORTE DE VISITA		
Conclusiones:		
La obra se encuentra con los trabajos concluidos sin detalles de mala calidad.		
REPORTE FOTOGRAFICO		
	23 at 15:00 http://doi.org/10.101/10.	
	Oficio de Aprobacio Oficio Ampliacion: Fondos: Importe Aprobado Importe Ejercido Contratista Palañilería Tablaroca Platones Acabados Pintura REPORTE DE VIS in detalles de mala	






Contraloría Municipal

Fecha: 18/Septiembre/2014

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA CEDULA DE VISITA DE OBRA


REPORTE FOTOGRAFICO






2.- Pavimento de concreto premezclado F'C 250 KG/CM²

3.- Guarnicion tipo L de 15x30x60 cm de concreto premezclado F'C $200~\text{KG/CM}^2$





4.- Calafateo en guarniciones

5.- Junta constructiva, calle F. Sarabia esquina con calle felipe Angeles.







Contraloría Municipal

Fecha: 18/Septiembre/2014

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA CEDULA DE VISITA DE OBRA


REPORTE FOTOGRAFICO





6.- Calafateo en pavimento.

7.- Calafateo en pavimento.



9.-

8.-





Contraloría Municipal

jazatlán, Sinaloa a 18 de Septiembre 2014

INFORME DE SUPERVISION

LIC FRANCISCO JAVIER ALVÁREZ DIAŽ CONTRALOR MUNICIPAL

PRESENTE!

Municipal realiza a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales-y otros; se-superviso-la-obra-Pavimentación-de-calle Privada Adelita, entre calle Cerro de la Sierpe y Ava Santa Rosa en Amp. Francisco Villa Correspondiente al programa recursos propios-2014, de lo cual informo los resultados obtenidos en la visita.

Visita de inspección realizada el día 17 de Septiembre del 2014 y el 01 de Agosto 2014.

CONTRATISTA: Constructora Luciernilla S.A,de-C-V

Se realizo un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la calidad de la obra así como también se haya elecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

Resultados de la Inspección Física.

La revisión física fue satisfactoria: se aprecia buena cálidad en los conceptos ejecutados por la contratista.

En la obra en mención se realización dos visitas de inspección.


La primera visita se realizo el día 01 de ágosto del 2014, al momento de la visita la contratista se encontraba realizando trabajos de excavaciones para la colocación de tomas domiciliarias.





Contraloría Municipal

La segunda visita se realizo el día 22 de Septiembre 2014, al momento de la visita de la obra, se encontraron los trabajos concluidos, pero aun sin operar, en espera que el pavimento cumpla con la resistencia requerida segun las especificaciones técnicas de la obra, y poder así reactivar el al transito vehicular sin.







Contraloría Municipal

Fecha: 18/Septiembre/2014

ONTROLAY SUPERA ULA DE VISITA DE	ISION DEOBRAGRUBIGA LOBRA	
	DATOS GENERALES DE LA OBRA	
Oficio de Aprobacio Oficio Ampliacion:	ón: 53/2014	
Fondos:	Obra Publica Directa	
Importe Aprobado	\$359,435.14	
Importe Ejercido	(En proceso 35%)	
Contratista	Constructora Luciernilla S.A de C.V	
	Contraloría.	
	Contraloría:	
1.	Ing. Jose Juan Tapia Lopez	
Frentes en los que se esta trabajando		
Albañilería Tablaroca Platones Acabados Pintura	Herreria Ins. Sanitaria Carpinteria Inst. Hidráulica Canceleria Inst. Eléctrica Obras EXT. Inst. Gas Pavimentación Inst. Equipo	
REPORTE DE VIS	ITA	
n espera que el pa hicular.	avimento cumpla con la resitencia requerida en las	
REPORTE FOTOGRAFICO		
	Oficio de Aprobacio Oficio Ampliacion: Fondos: Importe Aprobado Importe Ejercido Contratista In los que se esta Albañilería Tablaroca Platones Acabados Pintura REPORTE DE VISTA DE VISTA DE VISTA DE PORTE DE PORTE DE VISTA DE PORTE DE PORTE DE VISTA DE PORTE DE P	






Contraloría Municipal

Fecha: 18/Septiembre/2014

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA CEDULA DE VISITA. DE OBRA


REPORTE FOTOGRAFICO





2.- Pavimento de concreto premezclado F'C 250 $\rm KG/CM^2$

3.- Guarnicion tipo L' de 15x30x60 cm de concreto premezclado F'C 200 KG/CM 2





4.- Calafateo en guarniciones.

5.- Calle obstruida sin operar.






Contraloría Municipal


Fecha: 18/Septiembre/2014

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO





6.- Tomas domiciliarias.

7.- Tomas domiciliarias.





8.- Tomas domiciliarias.

9.- Tomas domiciliarias.

