



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa a 26 de Mayo 2015

INFORME DE SUPERVISION

**LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.**

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra pública** que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, se superviso la obra **Pavimentación en calle 5 de Febrero parte II entre Benito Juárez y Francisco I. Madero**, Correspondiente al programa **"PREDIAL RUSTICO 2014 "**, de lo cual informo los resultados obtenidos en la visita.

Visita de inspección realizada el 20 de Mayo del 2015.

CONTRATISTA:

Se realizo un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la calidad de la obra, así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

Resultados de la Inspección Física.

La obra se encuentra terminada sin operar, es espera de que el pavimento instalado alcance la resistencia requerida especificada en el proyecto para abrir el tránsito vehicular.

En los acabados de pavimento, guarniciones y calafateo de losas se aprecia buena calidad y se apega a las dimensiones y especificaciones establecidas en proyecto.

Se anexa al presente reporte fotográfico de visita de inspección.

Atentamente

**Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica**





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 26 /Mayo/2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA
PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO PARTE II ENTRE BENITO JUAREZ Y FRANCISCO I. MADERO.	Oficio de Aprobación: 497/2014
	Oficio Ampliación:
	Fondos: PREDIAL RUSTICO 2014
	Importe Aprobado \$343,381.55
	Importe Ejercido \$120,183.54
	Contratista CONSTRUMENTAS DEL NOROESTE S.A DE C.V

Datos de la Visita:	Contraloría.
Visita realizada el día 20 de Mayo 2015	Contraloría: Ing. Jose Juan Tapia Lopez

Frentes en los que se esta trabajando

<input type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria
<input type="checkbox"/> Despalmes	<input type="checkbox"/> Estruct. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica
<input type="checkbox"/> Terracerías	<input type="checkbox"/> Estruct. Metálica	<input type="checkbox"/> Plafones	<input type="checkbox"/> Cancelería	<input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica
<input type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.	<input type="checkbox"/> Inst. Gas
<input type="checkbox"/> Demoliciones	<input type="checkbox"/> Firmes	<input type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Pavimentación	<input type="checkbox"/> Inst. Equipo
<input type="checkbox"/> Otros (Especificar):	EQUIPOS DE GIMNACIO			

REPORTE DE VISITA

Conclusiones:

LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA, SIN OPERAR, EN ESPERA QUE EL PAVIMIENTO CUMPLA CON LA RESISTENCIA REQUERIDA EN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO PARA REALIZAR LA APERTURA AL TRANSITO VEHICULAR.

REPORTE FOTOGRAFICO



1.- Microlocalización Calle 5 de Febrero entre Benito Juárez y Francisco I. Madero Villa Unión.

Ing. José Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Pública





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán


Contraloría Municipal

Fecha : 26 /Mayo/2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA


REPORTE FOTOGRAFICO




2.- Pavimento FC 250 kg/cm2 con terminado escobillado, en calle 5 de Febrero.



3.- Pavimento FC 250 kg/cm2 con terminado escobillado, en calle 5 de Febrero

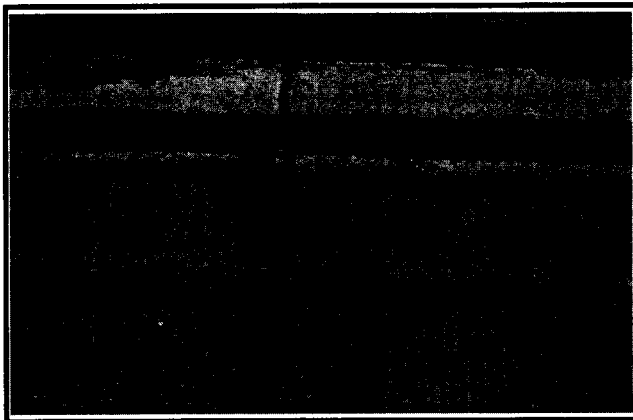

4.- Guarnicion tipo L 20x25x60 concreto FC 200 kg/cm2 en calle 5 de Febrero.

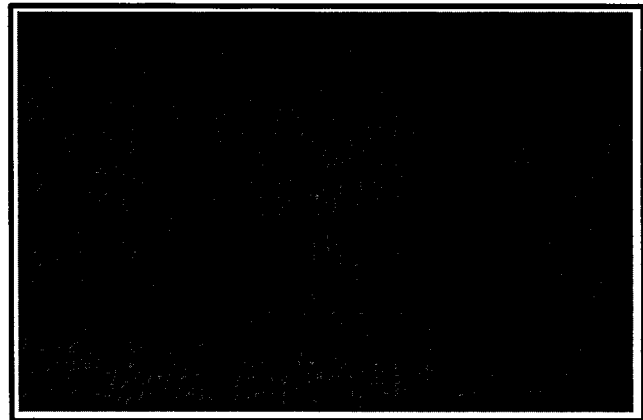

5.- Construjuntas de PVC en pavimento en calle 5 de Febrero.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán


Contraloría Municipal

Fecha : 26 /Mayo/2015


DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA


REPORTE FOTOGRAFICO




6.- Guarnicion tipo L 20x25x60 concreto FC 200 kg/cm² en calle 5 de Febrero.

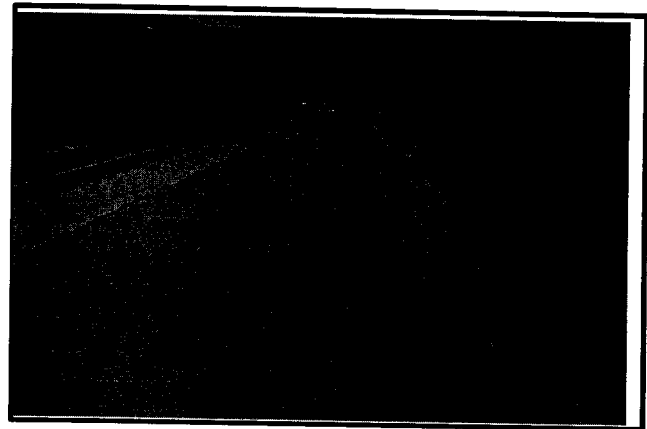

7.- Pavimento fc 250 kg/cm² en calle 5 de

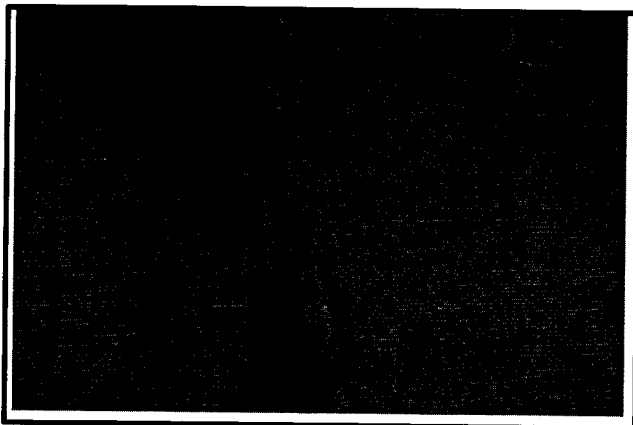

8.- Calafateo de losas y guarniciones .

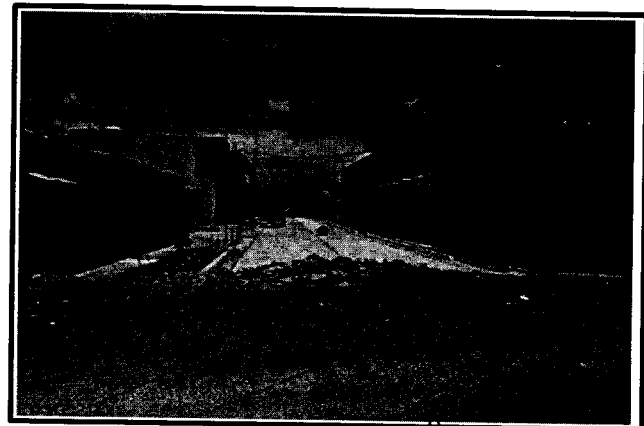

9.- Fin del tramo pavimentado, aun sin operar.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica

