



2014 - 2016

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Contraloría Municipal

OK

Mazatlán, Sinaloa a 24 de Mayo 2015

INFORME DE SUPERVISION

LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.

De acuerdo al programa de supervisiones a obra pública que esta Contraloría Municipal realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, se superviso la obra Pavimentación de calle Fresnos, entre Av. Santa Rosa y Calle Higueras, Frac Jacarandas, en esta Ciudad. Correspondiente al programa Contingencias Económicas 2014, de lo cual informo los resultados obtenidos en la visita.

Visita de inspección realizada el 18 de Junio del 2015.

CONTRATISTA: ING. RAMIRO BURGUENO LEAL

Se realizo un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la calidad de la obra, así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

Resultados de la Inspección Física.

La obra se encuentra terminada y operando operar, presentando buenos acabados y apeándose las especificaciones establecidas en el proyecto de la obra.

Se anexa al presente reporte fotográfico de visita de inspección.

Atentamente

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



MAZATLÁN

Edificio Mazatianguis Calle México y Tte. Azueta, Centro. Mazatlán, Sinaloa. Tel. 982-84-69

Construyendo Futuro



H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 19 /Junio/2015

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

GEDULA DE VISITA DE OBRA


PROYECTO:		DATOS GENERALES DE LA OBRA	
PAVIMENTACION DE CALLE FRESNOS, ENTRE AV. SANTA ROSA Y CALLE HIGUERAS, FRACC. JACARANDAS, EN ESTA CIUDAD.		Oficio de Aprobación:	530/2014 13 NOV 2014.
		Oficio Ampliación:	
		Fondos:	PROGRAMA DE CONTIGENCIAS ECONOMICAS 2014.
		Importe Aprobado	\$3,197,811.36
		Importe Ejercido	\$3,065,449.50
		Contratista	Ing. Ramiro Burgeño Leal
Datos de la Visita:		Contraloría.	
Visita Realizada el 18 de Junio 2015 (2DA) Visita realizada el día 21 de Febrero 2015 (1 RA)		Contraloría: Ing. Jose Juan Tapia Lopez	
Frentes en los que se esta trabajando			
<input type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería
<input type="checkbox"/> Despalmes	<input type="checkbox"/> Estruct. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpintería
<input type="checkbox"/> Terracerías	<input type="checkbox"/> Estruct. Metálica	<input type="checkbox"/> Plafones	<input type="checkbox"/> Cancelería
<input type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.
<input type="checkbox"/> Demoliciones	<input type="checkbox"/> Firms	<input type="checkbox"/> Pintura	<input checked="" type="checkbox"/> Pavimentación
<input type="checkbox"/> Otros (Especificar):	EQUIPOS DE GIMNACIO		<input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria
			<input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica
			<input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica
			<input type="checkbox"/> Inst. Gas
			<input type="checkbox"/> inst. Equipo

REPORTE DE VISITA

Conclusiones:

LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINA Y OPERANDO SIN DETALLES DE MALA CALIDAD.

REPORTE FOTOGRAFICO

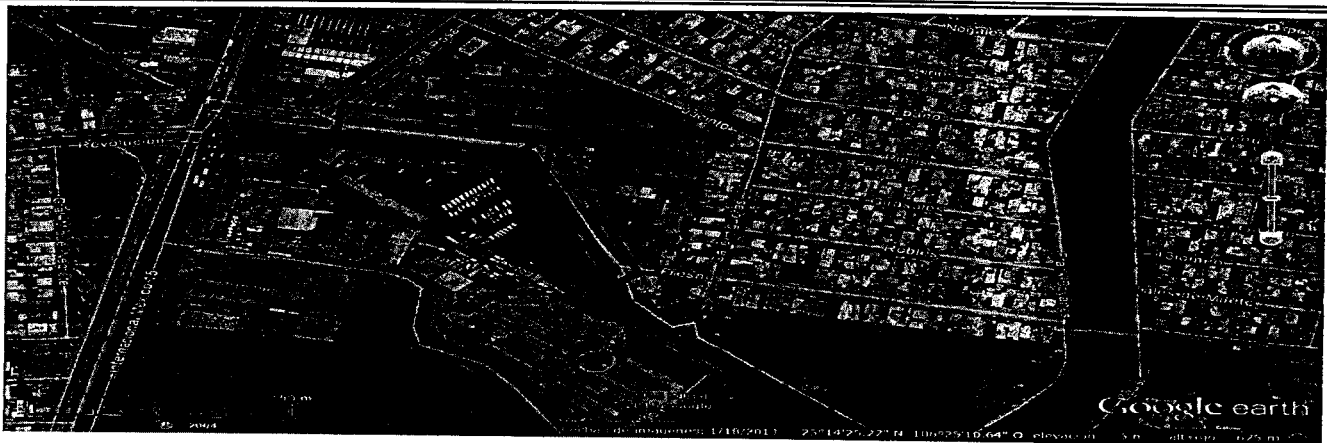


1.- Microlocalización Calle Fresnos, entre Avenida Santa Rosa y Calle Higuera, Fracc. Jacarandas.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica




REPORTE FOTOGRAFICO

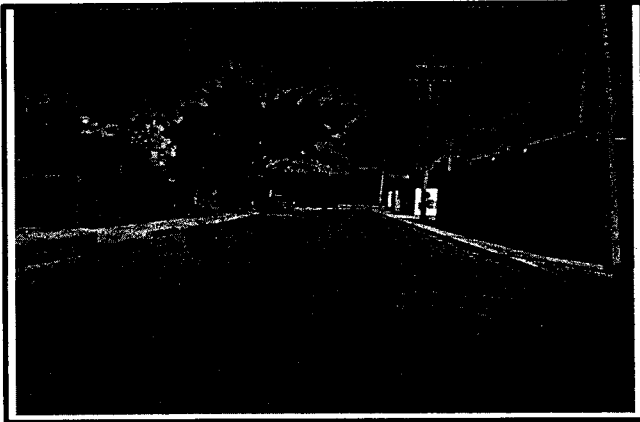


2.- Pavimentacion calle Frenos Concreto Fc 250 kg/cm2



3.- Pavimentacion calle Frenos Riego de Sello.



4.- Pavimentacion calle Frenos Concreto Fc 250 kg/cm2

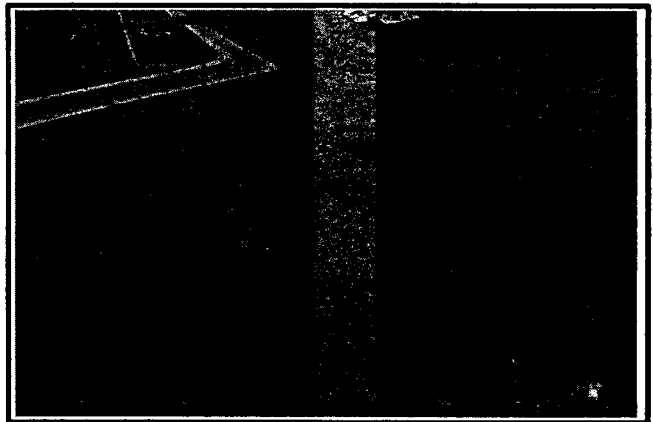


5.- Pavimentacion calle Frenos Colocacion de Guarniciones.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica


REPORTE FOTOGRAFICO




6.- Muro de Contencionen calle Frenos.

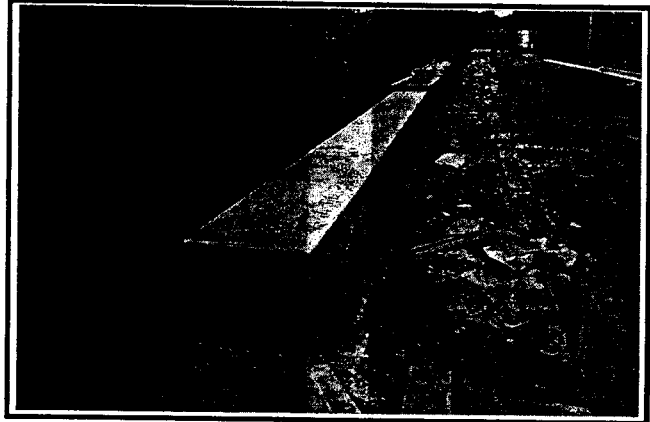

7.- Muro de Contencionen calle Frenos.

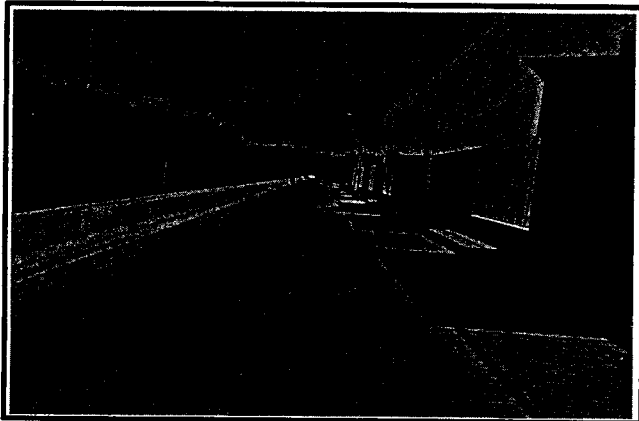

8.- Pavimentacion calle Frenos Concreto Fc'
250 kg/cm2

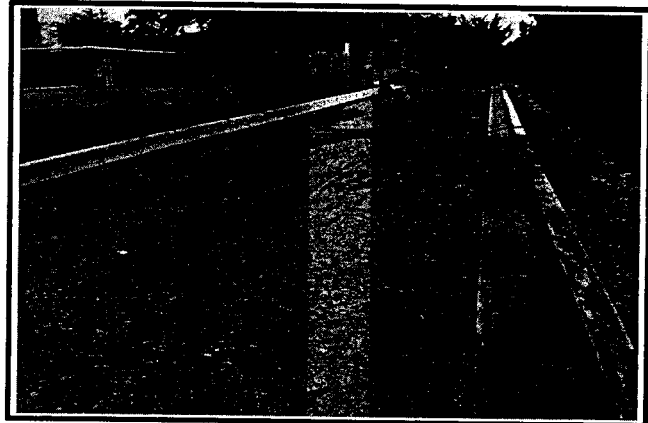

9.- Pavimentacion calle Frenos Colocacion de
Guarniciones.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán


Contraloría Municipal

Fecha : 19 /Junio/2015


DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDEJA DE VISITA DE OBRA


REPORTE FOTOGRAFICO

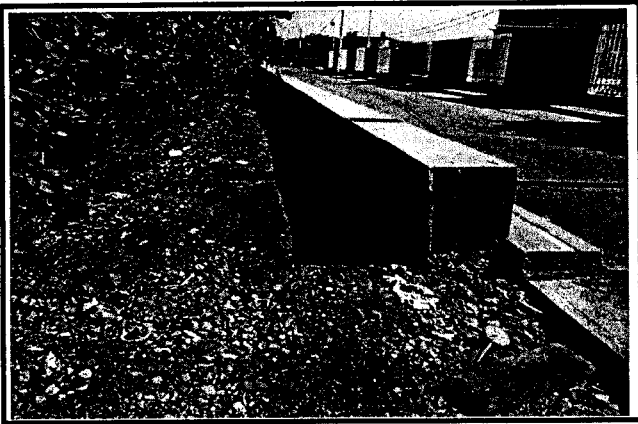


10.- Muro de Contencionen calle Frenos.

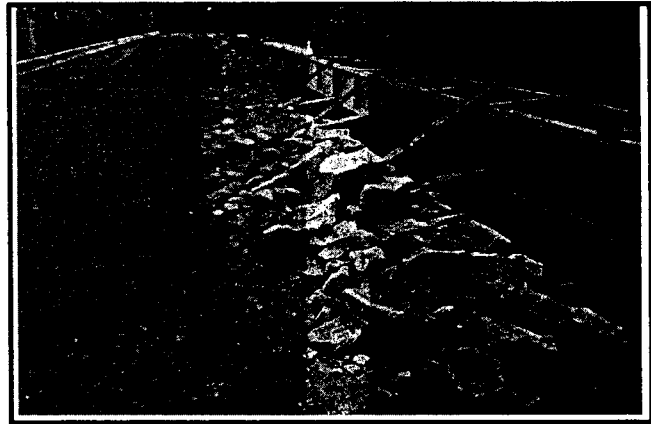

11.- Muro de Contencionen calle Frenos.

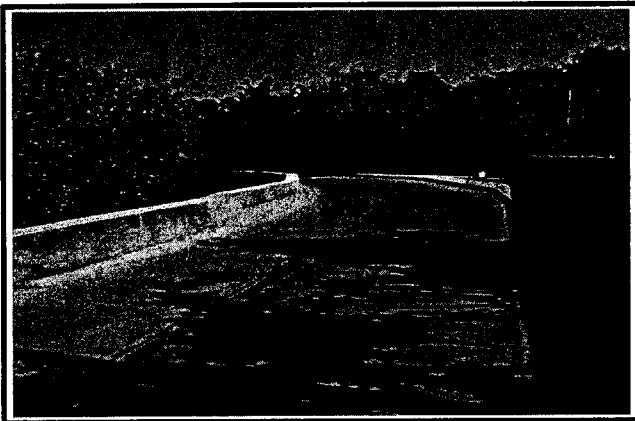

12.- Pavimentacion calle Frenos Concreto Fc 250
kg/cm2

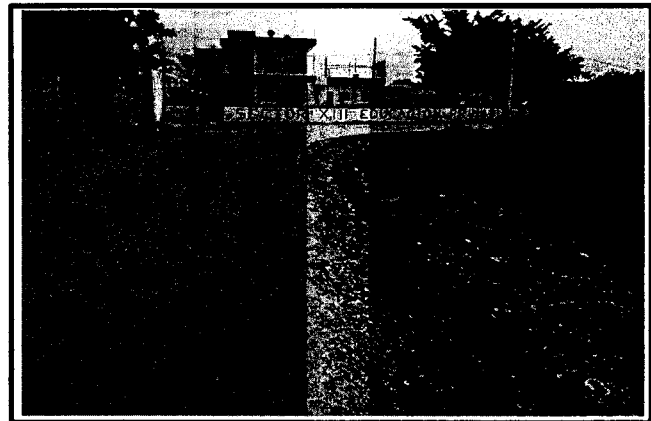

13.- Pavimentacion calle Frenos - colocacion de
Riego de sello y sanja para muro de contencion.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica

MAZATLÁN



H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán


Contraloría Municipal

Fecha : 19 /Junio/2015


DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA


REPORTE FOTOGRAFICO

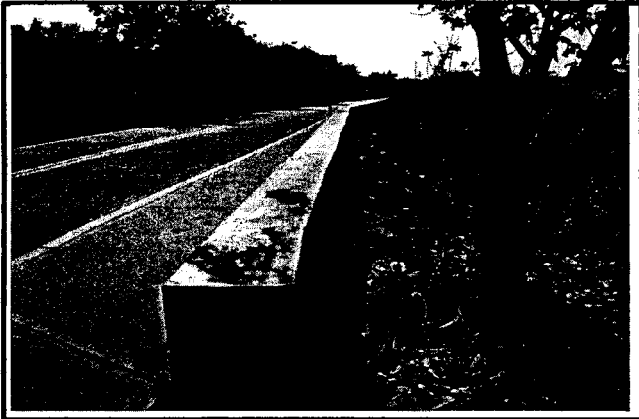


14.- Pavimentacion calle Frenos Concreto Fc 250 kg/cm2

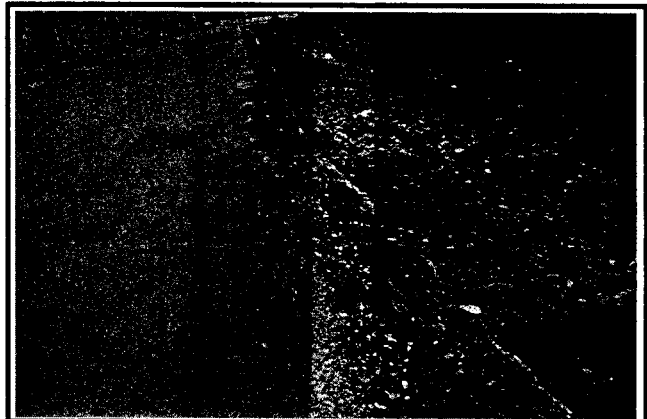

15.- Pavimentacion calle Frenos - colocacion de Riego de sello y sanja para muro de contencion.

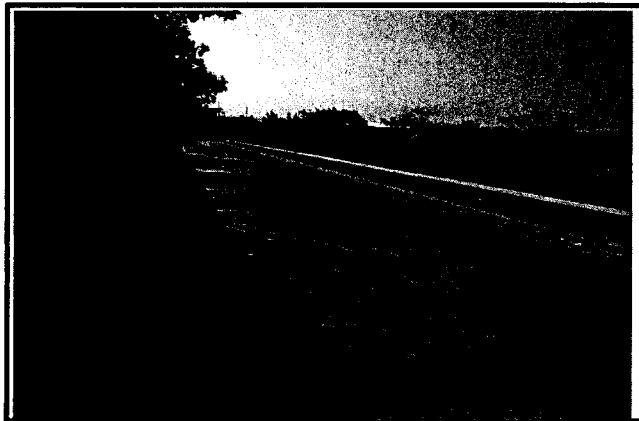

16.- Pavimentacion calle Frenos Concreto Fc 250 kg/cm2

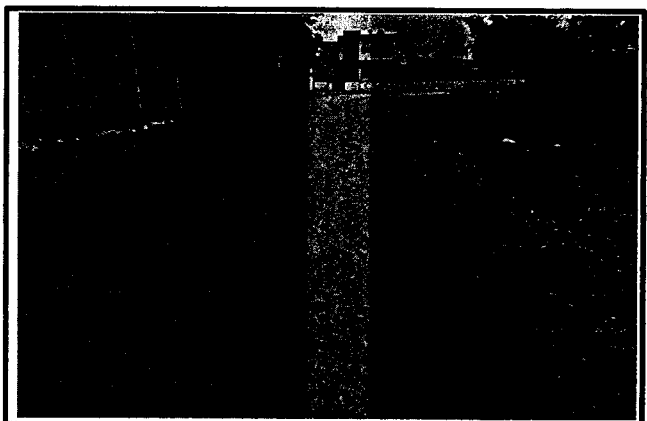

17.- Pavimentacion calle Frenos - colocacion de Riego de sello y sanja para muro de contencion

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica

