



2014 - 2016

Mazatlán, Sinaloa a 26 de Febrero 2016

INFORME DE SUPERVISION

**LIC. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL
PRESENTE.**

De acuerdo al programa de **supervisiones a obra pública** que esta **Contraloría Municipal** realiza, a obras ejecutadas con los recursos provenientes de ingresos municipales (recursos propios), así como los provenientes de recursos federales, estatales y otros, se superviso la obra **Pavimentación de callejón Hidalgo**, entre Emiliano Barragán y Tope de calle Gabriel Leyva en esta Ciudad., Correspondiente al **"Programa Obra Pública Directa 2015**, de lo cual informo los resultados obtenidos en la visita.

Visita de inspección realizada el 23 Febrero 2016.

CONTRATISTA: Construcciones y Urbanizaciones JAPAVA.

Se realizo un recorrido por la obra en mención con la finalidad de verificar la calidad de la obra, así como también se haya ejecutado conforme a normas y lineamientos establecidos en el proyecto ejecutivo de la obra.

Resultados de la Inspección Física.

En la visita se realizada se puro verificar que la obra se apega a las especificaciones del proyecto y contrato de la obra, los conceptos vistos en la visita fueron los siguientes:

- Guarnición Tipo L de 15x30x60,
- Pavimento premezclado de $f'c = 250 \text{ kg/cm}^2$
- Calafateo de Losas y Guarniciones.

La obra se encuentra terminada y operando sin detalles de mala calidad, por lo que no existen observaciones por consignar.

Se anexa al presente reporte fotográfico de visita de inspección.

Atentamente

**Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica**



MAZATLÁN



H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 26 /Febrero/2016

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

PROYECTO:	DATOS GENERALES DE LA OBRA	
PAVIMENTACION DE CALLEJON HIDALGO, ENTRE EMILIANO BARRAGAN Y TOPE DE CALLE GABRIEL LEYVA EN ESTA CIUDAD.	Oficio de Aprobación:	235/2015
	Oficio Ampliación:	
	Fondos:	OBRA PUBLICA DIRECTA 2015
	Importe Aprobado	\$563,674.90
	Importe Ejercido	\$563,674.90
Contratista	CONST. Y URB. JAPAVAL S.A DE C.V	

Datos de la Visita:	Contraloría.
Visita Realizada el dia 23 de Febrero del 2016	Contraloría: Ing. Jose Juan Tapia Lopez

Frentes en los que se esta trabajando

<input type="checkbox"/> Topografía	<input type="checkbox"/> Cimentaciones	<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Ins. Sanitaria
<input type="checkbox"/> Despalse	<input type="checkbox"/> Estruc. Concreto	<input type="checkbox"/> Tablaroca	<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Inst. Hidráulica
<input type="checkbox"/> Terracerías	<input type="checkbox"/> Estruc. Metálica	<input type="checkbox"/> Plafones	<input type="checkbox"/> Cancelería	<input type="checkbox"/> Inst. Eléctrica
<input type="checkbox"/> Excavaciones	<input type="checkbox"/> Techumbre	<input type="checkbox"/> Acabados	<input type="checkbox"/> Obras EXT.	<input type="checkbox"/> Inst. Gas
<input type="checkbox"/> Demoliciones	<input type="checkbox"/> Firmes	<input type="checkbox"/> Pintura	<input checked="" type="checkbox"/> Pavimentación	<input type="checkbox"/> Inst. Equipo
<input type="checkbox"/> Otros (Especificar):				

REPORTE DE VISITA

Conclusiones:

La obra se encuentra terminada y operando, sin de talles de mala calidad, po lo que no existen observaciones por

REPORTE FOTOGRAFICO



Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica





H. AYUNTAMIENTO
2011-2013

Gobierno Municipal de Mazatlán

Contraloría Municipal

Fecha : 26 /Febrero/2016

DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRA PUBLICA

CEDULA DE VISITA DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO




2.- Pavimento de concreto premezclado $f'c = 250$ kg/cm².



3.- Pavimento de concreto premezclado $f'c = 250$ kg/cm².



4.- Guarnicion Tipo L de 15x30x60 de concreto Premezclado $f'c = 200$ kg/cm².

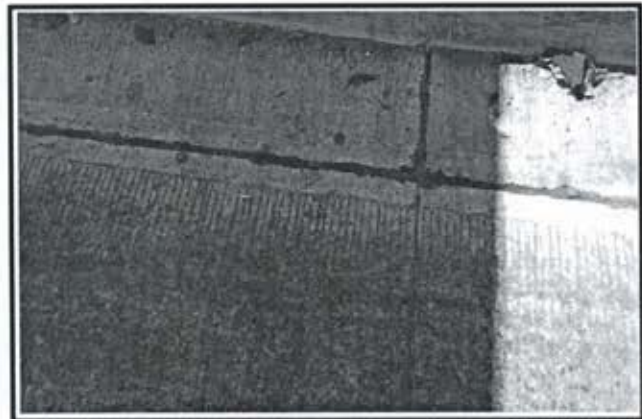

5.- Calafateo de Guarniciones.

Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica



REPORTE FOTOGRAFICO



6.- Junta constructiva en pavimento.




7.- Pavimento de concreto premezclado $f'c = 250$



8.- Medicion del pavimento en callejon Hidalgo.



9.- Rampas.



Ing. Jose Juan Tapia Lopez
Auditor de Obra Publica
